
공원녹지과



목 차



I. 부서 기본현황	1
II. 2025년 목표와 추진방향	5
① 내 손으로 정원, 내 곁에 정원	6
② 생활권 주변 다양한 도시숲 조성	8
③ 아름답고 쾌적한 도시녹지 관리	11
④ 모두가 누리고 즐기는 힐링파크	15
⑤ 안전하고 편안한 공원환경 제공	19
⑥ 多가치 산림자원 관리 및 육성	26
⑦ ‘치유와 쉼’ 이 있는 산림공간 조성	28
⑧ 맨발 1번가 “서구” 구현	31
⑨ 장기미집행 도시공원 조성	34

I. 부서 기본현황

1 업무현황

☐ 인 력

구분	총계 [①+②]	공 무 원 (일반임기제 포함)						정원 외	
		소계 [①]	5급	6급	7급	8급	9급	소계 [②]	내 용
현원	38	21	1	4	7	7	2	17	공무직 16 청원경찰 1

☐ 주요업무

팀 명 (정원 내/외 인원)	주 요 업 무	비 고
녹 지 팀 (7 / 7)	▶ 생활밀착형숲, 자연안심 그린숲, 도시바람길 숲, 학교 숲 조성 ▶ 담장허물어 나무심기, 녹지한평늘리기 등 도시녹화 ▶ 견고싶은 명품가로숲길, 초록이 넘치는 녹도 조성 ▶ 생활정원 조성 및 유지관리 등 ▶ 가로수(수벽) 식재, 가지치기, 병해충방제 작업 ▶ 가로화단 계절꽃 식재 등 예초·제초작업 ▶ 시설녹지(경관, 완충) 예초·제초작업 ▶ 공동주택 조경협의 및 심사 등	· 공무직 7
공원 조성 팀 (4 / 0)	▶ 도시계획시설(공원) 지정 검토 및 협의 ▶ 장기미집행 도시공원(재정공원) 조성사업 추진 ▶ 공원조성계획(변경) 수립 ▶ 우리동네 힐링파크 조성사업 추진 및 리모델링 조성 추진 ▶ 나눔누리숲조성 ▶ 염주어린이공원 바닥분수 조성사업 추진 ▶ 무장애 공원 화장실 설치 ▶ 민간공원 특례사업 추진	
공원관리팀 (6 / 9)	▶ 공원 내 어린이놀이시설·수경시설·물놀이장 유지 관리 ▶ 공원 수목 및 시설물 관리·환경정비·시설개선사업 ▶ 공원 내 화장실 유지관리 ▶공원 및 산책로 보안등 유지관리 ▶ 공원 이용 프로그램 운영 ▶공원 점용허가 및 불법행위 단속 ▶ 상무시민공원 등 공원 사용허가 및 문화행사 지원	· 공무직 9
산림휴양팀 (4 / 1)	▶ 맨발로(路) 조성 및 유지관리 ▶ 조림, 숲가꾸기 등 산림자원 조성 및 육성 ▶ 산불방지·산림병해충방제·산사태예방 등 산림재해 방지 ▶ 유아숲체험원, 숲해설 등 산림교육프로그램 운영 ▶ 산책로·주민쉼터 시설물 조성관리, 보호수 관리 등 ▶ 산림교육 프로그램 운영 및 유아숲체험원 유지·보수 ▶ 산지전용허가(협의), 산림소득지원 및 목재산업 업무	· 청원경찰 1

2 기본현황

□ 위원회 현황 : 1개(위원 9명)

위 원 회 명	설치목적	인원	임기	여성 위원 위촉 비율
산사태취약지역 지정위원회	산사태취약지역 지정 및 해제, 예방계획 등에 관한 사항	9명 (당연직 4, 위촉직 5)	2년	40% 남자 : 3명 여자 : 2명

□ 공원·녹지·산림 일반현황

○ 가로수 : 상무대로 등 139개 노선 166km 34,201주

노선명	연장 (km)	주수 (주)	수 종 별						
			느티	은행	벚나무	이팝나무	메타세쿼이아	버즘나무	기타
상무대로 등 139개 노선	166	34,201	11,378 (33.3%)	6,351 (18.6%)	5,032 (14.7%)	3,782 (11.1%)	1,147 (3.4%)	820 (2.4%)	5,691 (16.5%)

※출처 : 가로수 및 가로녹지 등 현황자료(기준 2024.12.31.)

○ 수벽 : 월드컵4강로 등 35개 노선 45km 72,563㎡

구 분	연 장		주수	주수종
월드컵4강로 등 35개 노선	45	가로수간	20	피라칸사스, 광나무, 꽃댕강나무
		일반가로	25	

※출처 : 가로수 및 가로녹지 등 현황자료(기준 2024.12.31.)

○ 가로화단 및 일반녹지 : 우석교차로 등 226개소 336,456㎡

구 분		위 치	개 소	면 적(㎡)	수목본수(주)
계			226개소	336,456	730,711주
가로화단		무진대로 등	45개소	104,435	느티 등 12종 515,396주
교통섬		농산물유통센터 등	22개소	13,354	느티 등 44,943주
IC		우석교차로 등	2개소	19,911	소나무 등 44,422주
기 타	조각숲	학두마을 입구 등	9개소	9,950	소나무 등
	소공원	구)미원 앞 등	19개소	18,949	느티 등 11종
	공공공지	쌍촌동 1271 등	28개소	48,885	느티 등 25종
	보행자도로	5·18자유공원 뒤 등	21개소	31,250	소나무 등 12종
	도시정원	벚꽃마을 정원 등	69개소	26,956	맥문동 등 30여종
	소광장	치평동 1262-4 등	4개소	3,080	느티 등 10여종
기타녹지		광주천변 등	7개소	59,686	원추리 등 30여종

※출처 : 가로수 및 가로녹지 등 현황자료(기준 2024.12.31.)

○ 시설녹지

구 분	계		조 성		미 조 성	
	지구	면적(㎡)	지구	면적(㎡)	개소	면적(㎡)
계	20	292,914	14	251,774	6	41,140
경 관 녹 지	10	150,737	7	147,813	3	2,924
완 충 녹 지	9	123,642	7	103,961	2	19,681
연 결 녹 지	1	18,535	-	-	1	18,535

※ 출처 : 도시공원 및 녹지현황 통계자료(기준 2024.12.31.)

○ 도시공원

구 분	계		조 성		조 성 중		미 조 성	
	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)
계	108(3)	4,464,272.0	86(3)	1,139,995.0	7	2,966,078.0	15	358,199.0
근린공원	23(3)	3,965,740.2	16(3)	659,050.2	5	2,961,770.0	2	344,920.0
어린이공원	65	161,847.8	56	149,473.8	2	4,308.0	7	8,066.0
역사공원	1	36,629.6	1	36,629.6			-	-
수변공원	3	288,028.0	3	288,028.0			-	-
소 공 원	16	12,026.4	10	6,813.4			6	5,213.0

※ 출처 : 도시공원 및 녹지현황 통계자료(기준 2024.12.31.)

※ 조성중 공원현황

- 근린공원(5) : 중앙, 마록, 영산강, 발산, 운천 / 어린이(2) : 쌍촌, 무지개

※ 미조성 공원현황

- 근린공원(2) : 광천재개발 1, 영외탄약고이전지 1 / 어린이공원(7) : 서창동 6, 광천재개발 1

- 소공원(6) : 양동재개발 2, 서창동 1, 매월동 2, 광천 1

※ 수변공원 : 천변근린(광주천), 상무(운천저수지), 전평제(전평저수지)

※ ()는 市에서 관리하는 5·18기념공원, 상록공원, 평화공원 포함

※ 화장실 현황 : 공중화장실 51개소 [공원 49(근린 20, 어린이 25, 역사 2, 수변 2), 금당산 2]

※ 음성인식비상벨 현황 : 51개소

○ 산림 : 791ha

계	국유림	공유림	사유림	산지 이용 구분		
				계	보전산지	준보전산지
791.0ha	36(4%)	23(3%)	732(93%)	791	470	321

※출처 : 산림임업통계연보 자료(기준 2024.12.31.)

○ 산책로 : 15코스 51.7km

산책로 명	코 스(개)	거 리(km)	주요 시설물
계	15	51.7	○ 체력단련시설 : 23종 282점 ○ 안전시설 - 계 단 : 4,305단 - 안내 표지 판 : 104점 - 안전로프 : 1,211m - 기 타 : 118점 ○ 편의시설 - 정 자 : 31동 - 의 자 : 382개 - 썬 베 드 : 8개 - 기 타 : 인공폭포 등 10개소
금당산	3	10.0	
중앙공원	6	25.3	
백석산	1	4.5	
개금산	1	3.5	
사월산	1	3.5	
백마산	1	2.2	
제봉산	1	0.5	
송학산	1	2.2	

○ 맨발 산책로 : 32개소

행정동	위 치	거리(m)	세 족 장	황토체험장	기 타
18개 동	32개	13,978	31개 소	8개 소	
양 동	양동초등학교	-	1	-	
양3동	발산근린공원	880	1	1	
농성1동	상록근린공원	240	1	-	
	직장어린이집	20	1	1	
농성2동	농성어린이공원	20	1	-	
	농성광장	200	1	-	
광천동	효광초등학교	-	1	-	
유덕동	상무4-1근린공원	450	1	-	
치평동	상무시민공원	600	2	1	보행 등
상무1동	상무2-3근린공원	320	1	-	보행 등
	걷기인마을(광명)	166	-	-	
상무2동	쌍학어린이공원	100	1	-	
	가톨릭평생교육원	120	-	-	에어먼지털이기
	효사어린이공원	100	1	-	
화정1동	광주서초등학교	-	1	-	
	내방어린이공원	20	1	-	
화정2동	주월초등학교	-	1	-	
	광덕고등학교	-	1	-	
화정3동	콩콩어린이공원	-	1	1	
	화정근린공원	180	1	-	市 조성
	염주근린공원	82	1	-	
화정4동	맛고을어린이공원	210	1	-	
서창동	전평제수변공원	120	1	1	
	백마산생태습지	770	-	-	
금호1동	푸름어린이공원	110	1	-	
금호2동	금호어린이공원	150	1	-	
풍암동	금당산(1구간)	700	3	2	
	금당산(2구간)	3,400	1	-	
	금당산(정상구간)	4,600	-	-	
	금당초등학교	-	1	-	
동천동	완 충 녹 지	300	1	1	
	유적근린공원	120	1	-	

Ⅱ. 2025년 주요업무 추진현황

부 서 목 표

주민과 함께 만드는
쉽고 문화가 있는 건강 그린도시 구현

전 략 과 제

세 부 사 업

내 손으로 정원, 내 곁에 정원	① 내 손으로 정원, 내 곁에 정원
생활권 주변 다양한 도시숲 조성	① 걷고 싶은 감탄마을길 조성 ② 화운로 가로정원 조성 ③ 화청3동 시그니처 공간 조성 ④ 주민힐링 체공을 위한 쌈지공원 조성
아름답고 쾌적한 도시녹지 관리	① 가로수(벽) 및 가로화단 관리 ② 시설녹지 유지·관리 ③ 가로수 식수대 정비사업 ④ 은행(암)나무 교체사업 ⑤ 화청동경관녹지 안전헨스 설치 ⑥ 화청동경관녹지 정비사업 ⑦ 풍암동 경관녹지 급경사지 정비사업
모두가 누리고 즐거는 힐링파크	① 우리동네 힐링파크 조성 ② 영남강 노을전망대와 어우러진 나눔누리숲 조성 ③ 염주어린이공원 바닥분수 조성 ④ 능성어린이공원 환경개선사업 ⑤ 두창애 공원 화장실 설치
안전하고 편안한 공원환경 제공	① 안심팍팍(park!) 건강팍팍(park!) ② 그린공원 시설 개선 및 유지·관리 ③ 어린이공원 소공원 유지 및 관리 ④ 운천호수 유지 및 관리 ⑤ 빽빽이나는 SUN SUN 공원 조성 ⑥ 꽃길 함께 정원 조성 ⑦ 매발로와 함께하는 꽃길 가드 조성 ⑧ 풍암동그린공원 내 그늘막 벤치 설치 ⑨ 풍암동생활체육공원 노후 광장 정비 ⑩ 모든 세대가 불편없이 이용할 수 있는 효행어린이공원 환경 정비 ⑪ 장유덕어린이공원 모험놀이 공간 조성 ⑫ 장유덕어린이공원 놀이터 바닥 정비 ⑬ 원마루, 오월어린이공원 노후시설 정비
多가치 산림자원 관리 및 육성	① 공익가치 증진을 위한 산림가꾸기 ② 산림재해 방지사업 추진
치유와 쉼 이 있는 산림공간 조성	① 편안하고 쾌적한 주민휴식공간 제공 ② 다양한 산림교육 프로그램 운영 ③ 유덕농촌민생이시설 설치 ④ 능성동 주민센터 교체사업
맨발 1번가 “서구” 구현	① 맨발로(路) 조성 및 관리 ② 동천동 맨발로 안심조명 설치 ③ 화청동린공원 시설개선 사업 ④ 금당산 산책로 경관조명 설치사업
장기미집행 도시공원 조성	① 미가공원 특례사업 ② 채청공원 조성

1

내 손으로 정원, 내 곁에 정원

‘착한도시 서구’ 실현을 위해 모두가 함께하는 거점 생활정원을 조성하고, 마을가드너를 활용한 정원 네트워크 구축 등 정원문화 활성화

□ **공약** 내 손으로 정원, 내 곁에 정원

[추진개요]

- 추진배경
 - (내 손으로 정원) “착한도시, 서구” 실현을 위한 참여형 생활정원 조성
 - (내곁에 정원) 마을가드너 양성 및 네트워크 구축을 통한 정원 문화 활성화
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 도시공원, 가로변, 녹지대, 유흥지, 학교 등 생활주변 공간
- 사업내용
 - 쉽고 여가가 있는 도시공원·녹지 내 생활정원, 기후위기 대응 및 탄소중립 실천을 위한 탄소 Zero 정원 조성
 - 주민과 직접 가꾸는 마을가드너 양성프로그램 운영 및 마을가드너 네트워크
- 소요예산 : 856,600천원(국 358,183 시 367,992 구 130,425)

[상반기 추진실적]

- 꽃향기 불어오는 바람길숲 조성사업
 - 실시설계 : '24. 10. 14 ~ '25. 4. 29.
 - 주민설명회 : '25. 3. 6.
 - 계약의뢰 : '25. 4. 29.
 - 사업시행(추진중) : '25. 6. 2. ~ 7. 11.
- 탄소zero 감탄도시숲 조성사업
 - 실시설계 : '25. 2. 4. ~ 4. 4.
 - 계약의뢰 : '25. 4. 11.
 - 사업시행(추진중) : '25. 6. 2. ~ 7. 4.
- 꽃마을 골목정원 관리
 - 예산재배정(구→화정3동) : '25. 1. 17.
- 금호1동 꽃길조성사업 재배정
 - 예산재배정(구→금호1동) : '25. 1. 17.
 - 사업시행(일부완료) : '25. 3. ~ 5.

- 주민이 직접 참여하여 가꾸는 늘봄정원 조성
 - 상반기 사업완료(농성1동 주민자치회 등 4개소) : '25. 4. ~ 6.
- 마을가드너 양성 및 네트워크 구축을 통한 정원 문화 활성화
 - 마을가드너 양성 프로그램 상반기 운영완료 : '25. 3. ~ 6.
 - (기본과정) 마을가드너 13명 양성 / 매주(화) 16:00~18:00 / '25.3.11. ~ 5.20.
 - (심화과정) 마을가드너 16명 양성 / 매주(수) 16:00~18:00 / '25.3.12. ~ 6.18.
 - 도시숲·정원관리인 운영(추진중) : '25. 1. ~ 12.
 - 도시숲·정원관리인 선발·운영(9명) : '25. 3. 17. ~ 9. 30.

[하반기 계획]

- 동 BI 및 걷기 좋은 소통 테마길과 연계한 정원 조성
 - 꽃향기 불어오는 바람길숲 조성사업 : '25. 6. 2. ~ 7. 11.
 - 탄소zero 감탄도시숲 조성사업 : '25. 6. 2. ~ 7. 4.
 - 꽃마을 골목정원 관리(화정3동) : '25. 7. ~ 12.
 - 금호1동 꽃길조성사업 : '25. 7. ~ 9.
 - 주민이 직접 참여하여 가꾸는 늘봄정원 조성(하반기) : '25. 7. ~ 12.
- 마을가드너 양성 및 네트워크 구축을 통한 정원 문화 활성화
 - 마을가드너 양성 프로그램 하반기 운영 : '25. 9. ~ 11.
 - (자격과정) 마을가드너 20명 운영
 - 도시숲·정원관리인 운영 : '25. 1. ~ 12.
 - 도시숲·정원관리인 선발·운영(9명) : '25. 3. 17. ~ 9. 30.



【늘봄정원 조성(농성1동)】



【마을가드너 양성 프로그램(심화과정)】

공원녹지과장 이정경(360-7402)	녹지팀장 전진형(360-7987)	주무관	김윤지(360-7986)
		주무관	서정표(360-7699)
		주무관	조은겸(350-4921)

2

생활권 주변 다양한 도시숲 조성

생활권 주변 다양한 녹색공간 확충으로 미세먼지 등 기후변화에 적극 대응하고, 탄소중립 실천으로 아름답고 쾌적한 도시환경 조성

□ 신규 걷고 싶은 감탄마을길 조성

[추진개요]

○ 추진배경

- 서부경찰서 주변 보행로에 수목을 식재함으로써 탄소저감 등 기후변화에 대응하고 도심 속 녹지공간 확충 및 쾌적한 보행환경 제공

○ 사업기간 : 2025. 7. 1. ~ 8. 29.

○ 사업대상 : 서부경찰서주변 보행자전용도로

○ 사업내용 : 가로화단 조성 및 수목식재

○ 소요예산 : 180,000천 원(시비재배정)

[상반기 추진실적]

○ 도시숲 조성사업 예산재배정(시→구)

: '25. 1. 16.


○ 실시설계

: '25. 2. 18. ~ 4. 18.

[하반기 계획]

○ 사업시행

: '25. 7. 1. ~ 8. 29.

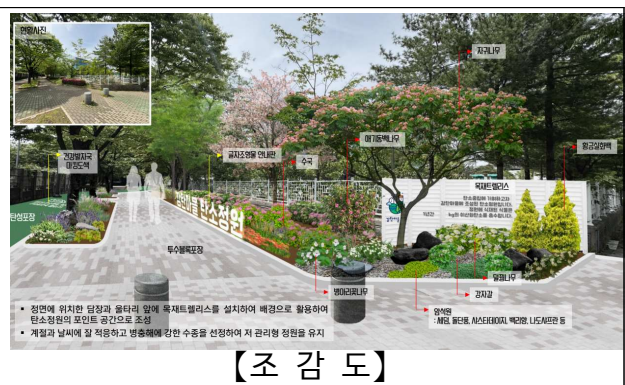

□ **신규** 화운로 가로정원 조성

[추진개요]

- 추진배경
 - 화정중학교 주변에 가로정원을 조성하여 도심속 녹지공간 확충
- 사업기간 : 2025. 4. 14. ~ 5. 11.
- 사업대상 : 화정동 1629번지 일원(화운로)
- 사업내용 : 가로화단 조성 및 수목식재
- 소요예산 : 70,000천원(시비재배정)

[상반기 추진실적]

- 도시숲 조성사업 예산재배정(시→구) : '25. 1. 16.
- 현장조사 및 설계 : '25. 2. ~ 3.
- 사업시행(완료) : '25. 4. 14. ~ 5. 11.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	녹지팀장 전진형(360-7987)	주무관 서정표(360-7699)
----------------------	--------------------	-------------------

□ **신규** 화정3동 시그니처 공간 조성

[추진개요]

- 추진배경
 - 화정3동 시그니처 공간을 조성하여 BI(역사품은 꽃마을) 가치제고 및 고도화를 통해 아름다운 꽃마을 조성에 기여하고, 쾌적한 가로경관 제공
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 화정로 ~ 월드컵4강로 교차로(예정)
- 사업내용 : 수목 및 초화류 식재, 주민휴게공간 조성 등
- 소요예산 : 30,000천원(주민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 예산 재배정(공원녹지과→화정3동) : '25. 1. 7.

[하반기 계획]

- 사업시행(화정3동) : '25. 7. ~ 12.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	녹지팀장 전진형(360-7987)	주무관 김윤지(360-7986)
----------------------	--------------------	-------------------

□ **신규** 주민힐링 제공을 위한 쌈지공원 조성

[추진개요]

- 추진배경
 - 방치되고 있는 유휴공간을 활용 및 정비하여 주민들에게 힐링공간 제공
- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 금호동 764
- 사업내용 : 수목 및 초화류 식재, 기반조성 등
- 소요예산 : 20,000천원(주민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 예산재배정(공원녹지과→금호1동) : '25. 1. 7.

[하반기 계획]

- 사업시행(금호1동) : '25. 7. ~ 10.

공원녹지과장	이정경(360-7402)	녹지팀장	전진형(360-7987)	주무관	서정표(360-7699)
--------	---------------	------	---------------	-----	---------------

3

아름답고 쾌적한 도시녹지 관리

도심 내 열악한 녹지공간의 생육환경을 개선하고, 주민의 생활 불편 해소를 위한 효율적인 녹지관리로 쾌적한 생활 환경 제공

□ 일반 가로수(벽) 및 가로화단 관리

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상
 - 가 로 수 : 상무대로 등 139개노선(은행나무 등 19종 34,201주)
 - 가로수벽 : 월드컵4강로 등 35개노선 45km(광나무 등 9종)
 - 가로화단 : 무진대로 등 45개소 104,435㎡
 - 기 타 : 청사주변 등 11개소 197개
- 사업내용 : 가지치기, 병해충방제, 제초, 급수 등
- 소요예산 : 1,230,849천원(시 204,600 구 1,026,249)

[상반기 추진실적]

- 주민불편 해소 등 가로수 유지관리 : '25. 1. ~ 6.
 - 가로수 정비 : 죽봉대로 등 전지 369주, 고사목 67주 정비
 - 한전배전선로 근접가로수 전지 : 경열로 등 46개노선 4,045주
 - 미국환불나무 등 가로수 병해충 방제 : 버즘나무 등 5,956주
 - 가로수 뿌리 정비 : 동천로 18번길 등 2개 노선 66주
 - 은행나무 암수교체사업 : 금부로 일원 18주
 - 재해위험 수목관리지원 : 마루동496-2 1개소
- 쾌적한 녹지공간 제공을 위한 가로화단 관리 : '25. 1. ~ 6.
 - 가로화단 : 제초 및 예초작업 (2회) / 가로수벽 전지(1회)
- 꽃피는 거리 조성을 위한 계절꽃 식재(14종 72,000본) : '25. 3월 / 5월

[하반기 계획]

- 주민불편 해소를 위한 가로수 관리 : '25. 7. ~ 11.
 - 고사목 제거 및 가로수 전지작업, 병해충 방제, 은행열매 채취, 가로수 뿌리 정비 등
- 꽃피는 거리 조성을 위한 계절꽃 식재 : '25. 9월 / 11월

공원녹지과장	이정경(360-7402)	녹지팀장	전진형(360-7987)	주무관	진민정(360-7698)
				주무관	조은겸(350-4921)

□ 일반 시설녹지 유지·관리

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상
 - 시설녹지 20개소 292,914㎡(완충녹지 9, 경관녹지 10, 연결녹지 1)
- 사업내용 : 녹지 내 수목전지 및 풀베기 등
- 소요예산 : 120,000천원(시 60,000 구 60,000)

[상반기 추진실적]

- 가로수 및 가로녹지 관리 계획 수립 : '25. 1. 15.
- 주민불편해소 및 생육공간 제공을 위한 수목정비 : 연중
 - 가지치기, 고사목제거 등
- 쾌적한 녹지공간을 제공을 위한 녹지정비 : 연중
 - 풀베기, 배수로 낙엽제거 등

[하반기 계획]

- 주민불편해소 및 생육공간 제공을 위한 수목정비 : 연중
 - 가지치기, 고사목제거 등
- 쾌적한 녹지공간을 제공을 위한 녹지정비 : 연중
 - 풀베기, 배수로 낙엽제거 등

공원녹지과장	이정경(360-7402)	녹지팀장	전진형(360-7987)	주무관	서정표(360-7699)
--------	---------------	------	---------------	-----	---------------

□ 신규 가로수 식수대 정비사업

[추진개요]

- 추진배경
 - 가로수 생장에 따른 뿌리 돌출, 파손된 가로수 식수대로 인하여 발생하는 안전 사고 예방 및 쾌적한 보행환경 제공
- 사업기간 : 2025. 3. 27. ~ 4. 23.
- 사업대상 : 동천로 18번길(동천리버팰리스 아파트 주변)
- 사업내용 : 가로수 뿌리정비, 보호틀 교체 등
- 소요예산 : 30,000천원(주민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 대상지 조사 및 설계 : '25. 1. ~ 2.
- 사업시행(완료) : '25. 3. 27. ~ 4. 23.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	녹지팀장 전진형(360-7987)	주무관 진민정(360-7698)
----------------------	--------------------	-------------------

□ **신규** 은행[암]나무 교체사업

[추진개요]

- 추진배경
 - 가을철이면 반복되는 은행나무 열매로 인한 악취 등 불편민원이 계속되고 있어 수나무 교체를 통해 쾌적하고 아름다운 가로수길 조성
- 사업기간 : 2025. 4. 4. ~ 6. 2.
- 사업대상 : 금부로 일원(금호중학교 주변)
- 사업내용 : 은행나무 암나무 제거 및 수나무 식재
- 소요예산 : 30,000천원(주민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 대상지 조사 및 설계 : '25. 1. ~ 2.
- 사업시행(완료) : '25. 4. 4. ~ 6. 2.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	녹지팀장 전진형(360-7987)	주무관 진민정(360-7698)
----------------------	--------------------	-------------------

□ **신규** 화정동 경관녹지 안전웬스 설치

[추진개요]

- 추진배경
 - 시설녹지와 공동주택 사이 웬스 설치로 경계를 명확히 하여 시설녹지 관리 체계화 및 안전사고 예방
- 사업기간 : 2025. 3. 25. ~ 5. 14.
- 사업대상 : 화정동 1616 일원
- 사업내용 : 안전웬스 설치
- 소요예산 : 50,000천원(주민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 대상지 조사 : '25. 1. ~ 2.
- 사업시행(완료) : '25. 3. 25. ~ 5. 14.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	녹지팀장 전진형(360-7987)	주무관 서정표(360-7699)
----------------------	--------------------	-------------------

□ 일반 시설녹지 정비사업

[추진개요]

- 추진배경
 - 시설녹지 내 편의시설 및 산책로 정비를 통해 쾌적한 녹지환경 제공
- 사업기간 : 2025. 6. ~ 12.
- 사업대상 : 금호동 784번지 외 시설녹지
- 사업내용 : 녹지 내 편의시설 설치 및 산책로 정비
- 소요예산 : 100,000천원(시민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 시설녹지정비 보조금 교부결정 통지 : '25. 1. 20.
- 시설녹지 정비사업 실시설계 용역 : '25. 6. 26. ~ 8. 4.

[하반기 계획]

- 사업시행 : '25. 8. ~

공원녹지과장 이정경(360-7402)	녹지팀장 전진형(360-7987)	주무관 서정표(360-7699)
----------------------	--------------------	-------------------

□ 일반 풍암동 경관녹지 급경사지 정비사업

[추진개요]

- 추진배경
 - 풍암동 급경사지는 집중호우에 따른 토석유출이 지속적으로 발생하고 있어 토석류 유출에 따른 인명 및 재산 피해 예방
- 사업기간 : 2025. 6. ~ 12.
- 사업대상 : 풍암동 1044번지 외 경관녹지(금당산)
- 사업내용 : 풍암동 경관녹지 배수로 정비 등
- 소요예산 : 250,000천원(특교세)

[상반기 추진실적]

- 재난안전관리 특별교부세 결정통지 : '25. 4. 24.
- 성립전 예산 집행승인 : '25. 5. 28.
- 실시설계용역 : '25. 6. 25. ~ 8. 23.

[하반기 계획]

- 사업시행 : '25. 9. ~

공원녹지과장 이정경(360-7402)	녹지팀장 전진형(360-7987)	주무관 서정표(360-7699)
----------------------	--------------------	-------------------

4

모두가 누리고 즐기는 힐링파크

주민과 함께 만들어 가는 만족도 높은 공원 조성으로 마을공동체 활성화에 기여하고 무장애 화장실 설치로 안전한 공원환경 제공

□ 공약 우리동네 힐링파크 조성

[추진개요]

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 사업대상 : 운천어린이공원 등 8개소
- 사업내용 : 놀이와 휴식이 공존하는 마을 커뮤니티 공간으로 공원 리모델링
 - 주민참여형 어린이공원 자문단 구성·운영으로 수요자 중심의 공원 조성
 - 동별 BI(Brand Identity)를 반영하여 마을의 거점공간으로 조성
 - 장애물 없는 시설물 설치로 안전한 공원 환경 제공
- 소요예산 : 총4,000,000천원

연차별 계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2022~2023년	2023~2024년	2024~2025년
사업내용	8개소	3개소 (농성, 서광, 맞고을)	2개소 (운천, 효사)	3개소 (꿈마당, 화추, 주동)
소요사업비(확보)	4,000(3,746)	1,000(1,000)	1,500(1,896)	1,500(850)

[상반기 추진실적]

- 운천어린이공원 조성사업 추진
 - 공사추진(완료) : '24. 11. 14. ~ '25. 4. 27.
 - 어린이 중심의 특화놀이터 조성
- 꿈마당어린이공원 조성사업 추진
 - 공원조성계획변경 및 실시설계 용역 추진 : '24. 12. 2. ~
 - 주민설명회 및 주민의견 수렴(4회) : '24. 12. 24 / '25. 2. 25 / 2. 27 / 6. 26
- 화추어린이공원 조성사업 추진
 - 특별조정교부금 교부(150백만원) 및 추경예산 편성 : '24. 12. 30. / '25. 5.
 - 추가 예산확보 노력 : '25. 1. ~
- 주동어린이공원 조성사업 추진
 - 조성계획 변경 및 실시설계 용역 : '25. 3. ~ 7.
 - 주민 의견 수렴 : '25. 3. ~ 4.
 - 주민설명회 : '25. 6. 30.



【운천어린이공원 어린이특화놀이터】



【운천어린이공원 감탄정원】

[하반기 계획]

- 운천어린이공원 조성사업 추진
 - 모니터링 결과 반영 보완공사 추진 : '25. 7.
 - 공원 명칭 변경 추진 : '25. 7. ~ 12.
- 꿈마당어린이공원 조성사업 추진
 - 공원조성계획 변경 및 실시설계 용역 : ~ '25. 8.
 - 공사추진 : '25. 9. ~ 11.
- 주동어린이공원 조성사업 추진 : '25. 8. ~ 12.

공원녹지과장 이정경(360-7987)	공원조성팀장 이정연(360-7990)	주무관 이호진(360-7587)	주무관 장주연(360-7058)
----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

□ **역점** 영산강 노을전망대와 어우러진 「나눔누리 숲 조성」

[추진개요]

- 사업기간 : 2023 ~ 2025
- 위 치 : 서창동 1044-8번지 외 2필지
- 면 적 : 3,705㎡
- 사업내용 : 노을과 역새를 조망하고, 지역의 나눔정신을 실현한 선인들의 의를 기리는 나눔누리 숲과 정원 및 산책로 조성 등
- 소요예산 : 1,050,000천원 (국 525,000 시 262,500, 구 262,500)

[상반기 추진실적]

- 나눔누리숲 조성사업 추진(완료) : '24. 11. ~ '25. 4

[하반기 계획]

- 나눔누리숲 유지·관리 : 연중



【사업 전】



【사업 후】

공원녹지과장 이정경(360-7402) | 공원조성팀장 이정연(360-7990) | 주무관 장주연(360-7058)

□ **신규** 염주어린이공원 바닥분수 조성

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 2. ~ 7.
- 사업대상 : 화정동 1713번지(염주어린이공원)
- 사업내용 : 물놀이형 수경시설 조성 등
- 소요예산 : 700,000천원(특교세 700,000)

[상반기 추진실적]

- 공원조성계획 변경 및 실시설계용역 : '25. 2. ~ 4.
- 공사추진 : '25. 6. ~

[하반기 계획]

- 바닥분수 운영·가동 : '25. 7월말(예정)



【위 치 도】



【조성계획(안)】

공원녹지과장 이정경(360-7402) | 공원조성팀장 이정연(360-7990) | 주무관 김승현(360-7726)

□ **신규** 농성어린이공원 환경개선사업

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 2. ~ 5.
- 사업대상 : 농성동 669-3번지(농성어린이공원)

- 사업내용 : 어린이놀이공간 및 주변환경 정비
- 소요예산 : 100,000천원(특교금 100,000)

[상반기 추진실적]

- 대상지 조사 및 실시설계 : '25. 2. ~ 3.
- 농성어린이공원 환경개선사업 추진(완료) : '25. 4. 4 ~ 5. 23.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원조성팀장 이정연(360-7990)	주무관 장주연(360-7058)
----------------------	----------------------	-------------------

□ 일반 무장애 공원 화장실 설치

[추진개요]

- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2025. 12.
- 사업대상 : 경열어린이공원 외 6개소 10동
 - 기존 화장실 보수(7동), 신설(1동), 철거 후 신축(2동)
- 사업내용 : BF(장애물 없는 생활환경) 인증으로 안전하고 쾌적한 화장실 제공
 - 보도에서 주출입구까지 장애인 등을 위한 기울기, 유효폭 등 보행로 확보
 - 시각·청각 장애인 등을 위한 점자블록, 손잡이 등 안내설비
- 소요예산 : 700,000천원(특교금 700,000)

[상반기 추진실적]

- 경열어린이공원 공중화장실 설치사업 (100,000천원)
 - 공원조성계획변경 및 실시설계 용역 : '24. 5. ~ '25. 2.
 - 사업추진 : '25. 3. ~
- 관내 도시공원 노후화장실 등 개선사업 (500,000천원)
 - 공원조성계획변경(오월) 및 실시설계 용역 : '24. 5. ~ '25. 2.
 - 사업추진 : '25. 5. ~
- 치평·운천어린이공원 노후화장실 개선사업 (100,000천원)
 - 추진완료(운천) : '25. 4. ~ 5.
 - 계약의뢰(치평) : '25. 5. ~

[하반기 계획]

- 경열어린이공원 공중화장실 설치사업
 - 공사추진 : ~ '25. 7.
 - BF본인증 용역 : '25. 7. ~ 12.
- 관내 도시공원 노후화장실 등 개선사업
 - 공사추진 : ~ '25. 9.
 - BF본인증 용역(오월) : '25. 7. ~ 12.
- 치평·운천어린이공원 노후화장실 개선사업
 - 공사추진(치평) : '25. 7. ~ 8.
 - BF본인증 용역(운천) : ~ '25. 12.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원조성팀장 이정연(360-7990)	주무관 김승현(360-7726)
----------------------	----------------------	-------------------

5

안전하고 편안한 공원환경 제공

누구나 찾고 싶고, 모두가 함께 즐길 수 있는 안전하고 쾌적한 공원 환경제공으로 주민의 삶의 질 향상에 기여

☐ **공약** 안심팍팍(park!) 건강팍팍(park!)

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 도시공원
- 사업내용 : 노후 운동기구 교체 및 비가림 시설 설치
 - 노후된 운동기구 정비로 및 비가림 시설 설치로 건강하고 안전한 공원 환경 제공
- 소요예산 : 100,000천원(시 100,000, 체육관광과)

[연차별 추진계획]

구 분	계	기 투자(~2023년)	2024년	2025년
사업비(백만원)	625	350	175	100

[상반기 추진실적]

- 추경예산 편성(1차) : '25. 5.
- 실시설계용역 추진 : '25. 5. 30. ~ 6. 26.

[하반기 계획]

- 계약심사 : '25. 7.
- 사업추진 : '25. 7. ~ 8.

공원녹지과장 이정경(360-7402) | 공원관리팀장 이종탁(360-7989) | 주무관 김선율(360-4938)

□ 일반 **근린공원 시설 개선 및 유지·관리**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 17개소(근린공원 13, 역사공원 1, 수변공원 3)
- 사업내용 : 근린공원 유지관리를 위한 연간단가 및 시설 보수 등
- 소요예산 : 960,000천원(시 480,000, 구 480,000)
 - 공원 내 각종시설 및 수목관리 960,000천원

[상반기 추진실적]

- 도시공원 유지·관리 추진계획 수립 : '25. 1. 14.
- 공원시설 점검 및 유지·관리 계획 수립 : '25. 2. 24.
- 공원 내 시설물 및 녹지대 유지관리 단가계약(1차) : '25. 1 ~ 6.
- 도시공원 소규모 시설 보수(7건) : '25. 1. ~ 6.
- 공원 가로등 연간단가 사업 추진(1차) : '25. 1. ~ 6.
- 공원 내 공중화장실 연간단가 사업 추진(1차) : '25. 1. ~ 6.
 - 공중화장실 51개소 시설물 유지보수(기후환경과예산)
- 2025년 공원 환경정비사업 : '25. 1. ~ 6.
 - 기간제 근로자 공중화장실 청소 등 유지·관리

[하반기 계획]

- 공원 내 시설물 및 녹지대 유지관리 단가계약 : '25. 7 ~ 12.
- 공원 가로등 연간단가 사업 추진 : '25. 7 ~ 12.
- 도시공원 소규모 시설 보수 : '25. 7 ~ 12.
- 공원 내 공중화장실 연간단가 사업 추진 : '25. 7 ~ 12.
- 2025년 공원 환경정비사업 : '25. 7 ~ 12.
- 근린공원 유지관리 : '25. 7. ~ 12.
 - 놀이시설, 편익시설, 안내판 정비 등 수시 보수
 - 전평호수 연꽃대 정비
- 도시공원 이용자 만족도 조사(상·하반기) : '25. 7. / 12.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원관리팀장 이종탁(360-7989)	주무관	홍미미(360-7988)
		주무관	이다영(360-7724)
		주무관	윤지영(360-7725)
		주무관	김선율(350-4938)
		주무관	정근수(360-7723)

□ 일반 어린이공원 · 소공원 유지 및 관리

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 어린이공원 56개소 / 소공원 10개소 / 화장실 25개소
- 사업내용 : 어린이공원 및 소공원 유지관리를 위한 시설 보수 등
- 소요예산 : 796,838천원(구 796,838)
 - 공원 내 각종시설 및 수목관리지원 796,838천원

[상반기 추진실적]

- 이양업무 관련 어린이공원(소공원) 관리 매뉴얼 송부[구→동] : '25. 2. 11.
 - 공원 현황, 녹지대 관리 방법, 공원화장실 청결 관리 등(공원녹지과)
- 이양업무 관련 어린이공원(소공원) 관리예산 재배정[구→동] : '25. 2. 11.
 - 녹지대 관리 인건비(공원녹지과) 및 화장실 청결관리(기후환경과)
- 2025년 상반기 안심놀이터 환경정비 용역 추진 : '25. 4. 1 ~ 4. 15
 - 사업내용 : 모래놀이터 소독 7,437㎡, 탄성포장 소독 10,247㎡, 놀이기구 세척 120점
- 어린이공원 시설물 보수(8건) : '25. 1. ~ 6.
- 도시공원 별별체험 프로그램 운영 : '25. 4. ~ 6.
- 2025년 도시공원 물놀이장 바닥 보수 공사 : '25. 5. 26 ~ 6. 22
 - 사업내용 : 물놀이장 탄성포장 세척 및 재코팅
- 운천호수 바닥분수 보수 공사 : '25. 6.
 - 사업내용 : 노즐 등 노후 시설물 보수

[하반기 계획]

- 이양업무 모니터링 : 연중
 - 녹지대 관리 : 16개동(예초작업 횟수 : 연 3~4회)
 - 화장실 청소 : 9개동 25개소
- 상무시민공원 지하수 시설 환경영향평가 및 사후관리 용역 추진 : '25. 7. ~ 9.
- 2025년 하반기 안심놀이터 환경정비 용역 추진 : '25. 8. ~ 9.
- 어린이공원 시설물 유지관리 : 연중
 - 놀이시설, 편익시설, 안내판 정비 등 수시 보수
- 물놀이장 운영 : '25. 7. ~ 8.
- 도시공원 별별체험 프로그램 운영 : '25. 7. ~ 10.
- 도시공원 별별체험 프로그램 만족도 조사(상·하반기) : '25. 7. / 12.
- 별밤 캠프닉 데이 행사 추진 : '25. 10.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원관리팀장 이종탁(360-7989)	주무관	홍미미(360-7988)
		주무관	이다영(360-7724)
		주무관	윤지영(360-7725)
		주무관	김선율(350-4938)
		주무관	정근수(360-7723)

□ **일반** **운천호수 유지 및 관리**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 쌍촌동 869-9번지 일원(운천호수)
- 사업내용 : 운천호수 1개소, 바닥분수 1개소 관리 등
- 소요예산 : 4,000천원(시 2,000, 구2,000)

[상반기 추진실적]

- 추경예산 반영(1차) : '25. 5.

[하반기 계획]

- 시설물 유지 관리 : '25. 7. ~ 12.

공원녹지과장	이정경(360-7402)	공원관리팀장	이종탁(360-7989)	주무관	정근수(360-7723)
--------	---------------	--------	---------------	-----	---------------

□ **신규** **빛이나는 SUN SUN 공원 조성**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 4. 25. ~ 5. 19.
- 사업대상 : 효광어린이공원(쌍촌동 1213)
- 사업내용 : 공원등주 및 등기구 교체 4개소, 분전함 제어기 교체 1식
- 소요예산 : 15,000천원(구 15,000, 주민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 현장조사 및 실시설계 : '25. 2. ~ 3.
- 공사 추진(완료) : '25. 4. 25. ~ 5. 19.

공원녹지과장	이정경(360-7402)	공원관리팀장	이종탁(360-7989)	주무관	정근수(360-7723)
--------	---------------	--------	---------------	-----	---------------

□ **신규** **꽃길 함께 정원 조성**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 4. 24. ~ 5. 21.
- 사업대상 : 풍암생활체육공원(풍암동36)
- 사업내용 : 수목식재 등 정원 조성
- 소요예산 : 30,000천원 (구 30,000, 주민참여예산)

[상반기 추진실적]

○ 공사 추진(완료)

: '25. 4. 24 ~ 5. 21



【사업 전】



【사업 후】

공원녹지과장	이정경(360-7402)	공원관리팀장	이종탁(360-7989)	주무관	윤지영(360-7725)
--------	---------------	--------	---------------	-----	---------------

☐ **신규 맨발로와 함께하는 꽃길 가득 조성**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 4. 24. ~ 5. 16.
- 사업대상 : 돛단배공원(상무4-1근린공원)
- 사업내용 : 애기동백(H2.0*W1.2) 125주 식재
- 소요예산 : 50,000천원(구 50,000, 주민참여예산)

[상반기 추진실적]

○ 현장조사 및 자체설계

: '25. 2. ~ 3.

○ 공사 추진(완료)

: '25. 4. 24. ~ 5. 16.

공원녹지과장	이정경(360-7402)	공원관리팀장	이종탁(360-7989)	주무관	홍미미(360-7988)
--------	---------------	--------	---------------	-----	---------------

☐ **신규 유적근린공원 내 그늘막 벤치 설치**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 2. ~ 3.
- 사업대상 : 유적근린공원(동천동 660번지)
- 사업내용 : 그늘막 벤치 설치
- 소요예산 : 7,500천원(구 7,500, 주민참여예산)

[상반기 추진실적]

○ 벤치 구입 및 설치(완료)

: '25. 4. 4.

공원녹지과장	이정경(360-7402)	공원관리팀장	이종탁(360-7989)	주무관	윤지영(360-7725)
--------	---------------	--------	---------------	-----	---------------

□ **신규** 풍암생활체육공원 노후 광장 정비

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 9.
- 사업대상 : 풍암생활체육공원(풍암동 36번지)
- 사업내용 : 광장 바닥 재포장 및 축구 수로관 설치 등
- 소요예산 : 70,000천원(특교금 70,000)

[상반기 추진실적]

- 추경예산 편성(1차) : '25. 5.
- 현장조사 및 자체설계 : '25. 6.

[하반기 계획]

- 계약 및 공사추진 : '25. 7. ~ 9.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원관리팀장 이종탁(360-7989)	주무관 이다영(360-7724)
----------------------	----------------------	-------------------

□ **신규** 모든 세대가 불편없이 이용할 수 있는 효행어린이공원 환경 정비

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 9.
- 사업대상: 효행어린이공원(화정동 802번지)
- 사업내용 : 공원 바닥면 탄성포장 및 노후 시설 정비 등
- 소요예산 : 140,000천원(특교금 140,000)

[상반기 추진실적]

- 추경예산 편성(1차) : '25. 5.
- 현장조사 및 자체설계 : '25. 6.

[하반기 계획]

- 계약 및 공사추진 : '25. 7. ~ 9.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원관리팀장 이종탁(360-7989)	주무관 이다영(360-7724)
----------------------	----------------------	-------------------

□ **신규** 장수어린이공원 모험놀이 공간조성

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 5. 28. ~ 7. 6.
- 사업대상 : 장수어린이공원(치평동 1166-10번지)
- 사업내용 : 모험놀이기구 설치 등
- 소요예산 : 50,000천원(특교금 50,000)

[상반기 추진실적]

- 현장조사 및 자체설계 : '25. 3. ~ 4.
- 계약의뢰 : '25. 5. 16.

[하반기 계획]

- 공사 추진 : '25. 5. 28. ~ 7. 6.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원관리팀장 이종탁(360-7989)	주무관 홍미미(360-7988)
----------------------	----------------------	-------------------

☐ **신규 유덕어린이공원 놀이터 바닥 정비**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 3. 12. ~ 4. 8.
- 사업대상 : 유덕어린이공원(유촌동 873번지)
- 사업내용 : 탄성포장면 교체 등
- 소요예산 : 50,000천원(특교금 50,000)

[상반기 추진실적]

- 성립전 집행 승인 : '25. 2. 12.
- 공사추진(완료) : '25. 3. 12 ~ 4. 8.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원관리팀장 이종탁(360-7989)	주무관 이다영(360-7724)
----------------------	----------------------	-------------------

☐ **신규 원마루, 오월어린이공원 노후시설 정비**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 9.
- 사업대상 : 원마루어린이공원(차평동 1280-1번지), 오월어린이공원(쌍촌동 1288-2번지)
- 사업내용 : 노후 어린이놀이시설 및 바닥 정비 등
- 소요예산 : 300,000천원(특교세 300,000)

[상반기 추진실적]

- 성립전 집행 승인 : '25. 2. 12.

[하반기 계획]

- 원마루어린이공원 놀이터 정비 사업 추진 : '25. 6. 16 ~ 8. 14
- 오월어린이공원 노후시설 정비사업 사업 추진 : '25. 7. ~ 9.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원관리팀장 이종탁(360-7989)	주무관 이다영(360-7724)
----------------------	----------------------	-------------------

산림의 공익적 가치 증진과 자원 육성을 위한 나무심기, 숲가꾸기 등
산림사업 추진으로 기후변화 대응 및 도시환경 개선

□ 일반 공익가치 증진을 위한 산림가꾸기

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 2. ~ 11.
- 사업대상 : 금당산, 백마산 등 관내 산림
- 사업내용
 - 큰나무공익조림 2ha, 정책숲가꾸기 50ha, 미세먼지저감숲가꾸기 26ha 등
- 소요예산 : 229,647천원(국 55,442, 기금 35,256 시 27,210, 구 111,739)

[상반기 추진실적]

- 큰나무 공익조림 사업 완료 : '25. 3.
 - 2ha, 애기동백나무 115주
- 정책숲가꾸기사업 : '25. 3. ~ 6.
 - 어린나무가꾸기 5ha, 풀베기 15ha
 - 적기에 시행하여 건강하고 우량한 숲을 가꾸어 공익가치 증진 기여
- 미세먼지저감숲가꾸기사업 : '25. 5. ~ 6.
 - 송학산 일원, 속아베기 26ha
- 산림현장민원처리단 운영(2명) : '25. 3. ~ 6.
 - 산림 내 고사목 및 덩굴 제거 등 민원 처리

[하반기 계획]

- 정책숲가꾸기사업 : '25. 6. ~ 9.
 - 조림지풀베기 15ha, 덩굴제거 15ha
- 산림현장민원처리단 운영(2명) : '25. 6. ~ 11.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	산림휴양팀장 송희주(360-7897)	주무관 안효희(360-7899)
		주무관 오미영(360-7696)

□ 일반 산림재해 방지사업 추진

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 금당산, 백마산 등 관내 산림
- 사업내용 : 산불방지, 산림병해충 방제, 소나무재선충병 방제, 산사태 방지 등
- 소요예산 : 273,690천원(국 123,496, 시 52,380 구 97,814)

[상반기 추진실적]

- 산불방지사업
 - 산불조심기간 설정 및 대책본부 설치 운영 : '25. 1.24. ~ 5. 15.
 - 봄철 '25. 2. 1. ~ 5. 15.
 - 산불전문예방진화대 선발·운영(봄철 8명 / 가을철 6명)
 - 산림인접지역 인화물질 사전제거(서창동 일원) : '25. 2. ~ 5.
- 재난안전 특별산불대책 수립
 - 산불위험도알리미 설치 : '25. 5. 26.
- 산림병해충 방제사업
 - 산림병해충 예찰·방제대책본부 설치 운영 : '25. 6.
 - 산림병해충예찰방제단 선발·운영(2명) : '25. 2. ~ 6.
- 소나무재선충병 방제
 - 소나무재선충병 방제 작업(송학산 60ha) : '25. 2. ~ 3.
 - 소나무류이동단속원 선발·운영(2명) : '25. 2. ~ 6.
- 산사태 방지
 - 산사태 예방 종합대책 수립 : '25. 5. 23.
 - 산사태 예방 사방지 등 점검(2회) : '25. 2. ~ 6.
 - 산사태현장예방단 선발·운영(2명) : '25. 5. ~ 6.
 - 산사태현장예방단 직무교육 실시 : '25. 5. 23.

[하반기 계획]

- 2025년 사방시설 외관점검 용역 추진 : '25. 6.
- 가을철 산불대책본부 운영 및 진화대 선발(6명) : '25. 11. 1. ~ 12. 15.
- 산불병해충 예찰방제단 운영(2명) : '25. 6. ~ 11.
- 소나무류이동단속원 운영(2명) : '25. 6. ~ 11.
- 산사태현장예방단 운영(2명) : '25. 6. ~ 11.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	산림휴양팀장 송희주(360-7897)	주무관 안효희(360-7899)
		주무관 오미영(360-7696)

산책로, 쉼터 등의 체계적 관리로 편안한 여가 공간을 조성하고 산림 복지 서비스 제공으로 시민의 삶의 질 향상

□ 일반 편안하고 쾌적한 주민휴식공간 제공

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상
 - 산 책 로 : 금당산 등 15개 코스 51.7km
 - 주민쉼터 : 풍암정 등 95개소
 - 보 호 수 : 풍암동 버드나무 등 14주(느티 3, 팽 6, 버드 3, 소나무류 2)
- 사업내용 : 시설물 정비, 가지치기, 병해충 방제, 제초, 급수 등
- 소요예산 : 87,008천원(구 87,008)

[상반기 추진실적]

- 산책로 시설물 안전점검 및 유지관리
 - 산림휴양시설 유지관리 추진계획 수립 : '25. 2. 13.
 - 해빙기 산책로 시설물 안전점검 : '25. 3. 6. ~ 3. 14.
 - 산책로 예초작업 및 도복목 제거 : '25. 2. ~ 6.
 - 여름철 집중호우 대비 시설물 점검 : '25. 5. ~ 6.
- 산책로 보수 공사
 - 2024년 등산숲길 정비사업(금당산 정상) : '24. 11. ~ '25. 4.
- 주민쉼터 정비사업
 - 유덕동 865-4 주민편의시설(원형벤치) 설치 : '25. 2. ~ 3.
 - 금당산 신암정 지붕보수, 금광사 쉼터 정비 : '25. 5.

[하반기 계획]

- 하반기 쉼터 일제조사 및 보수공사 추진 : '25. 6. ~ 9.
- 하반기 산책로 점검 및 예초작업 추진 : '25. 6. ~ 10.
- 보호수 실태조사 및 정비공사 : '25. 6. ~ 11.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	산림휴양팀장 송희주(360-7897)	주무관 안효희(360-7899)
		주무관 오미영(360-7696)

□ 일반 다양한 산림교육 프로그램 운영

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 유아숲체험원 3개소, 백마산생태습지, 공원, 학교숲 등
- 사업내용 : 유아숲체험 · 숲해설 프로그램 운영 등
- 운영방법 : 산림교육 프로그램 위탁운영
- 소요예산 : 144,666천원(국 60,333 시 42,233 구 42,100)

[상반기 추진실적]

- 산림교육(유아숲교육 · 숲해설) 프로그램 추진계획 수립 : '25. 1. 17.
- 위탁운영 사업자 모집공고 및 계약체결 : '25. 3. 24.
- 산림교육(유아숲교육 · 숲해설) 프로그램 운영 : '25. 3. ~ 12.

[하반기 계획]

- 산림교육(유아숲교육 · 숲해설) 프로그램 운영 : '25. 3. ~ 12.
- 서창역새축제 홍보부스 · 여름숲 프로그램 · 유아숲 페스티벌 등 특별프로그램 운영
- 산림교육 만족도 조사(상 · 하반기) : '25. 6. / 12.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	산림휴양팀장 송희주(360-7897)	주무관 윤희욱(360-7610)
----------------------	----------------------	-------------------

□ 신규 유덕동 주민편의시설 설치

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2.
- 사업대상 : 유덕동 865-4 일원
- 사업내용 : 옥외용 벤치 2개소 설치
- 소요예산 : 6,000천원(구 6,000, 주민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 추진계획 수립 : '25. 2. 13.
- 원형벤치 설치사업 추진 : '25. 2. ~ 3.

[하반기 계획]

- 주민편의시설 유지관리 : 연중



공원녹지과장 이정경(360-7402)	산림휴양팀장 송희주(360-7897)	주무관 안효희(360-7899)
----------------------	----------------------	-------------------

☐ **신규 농성동 주민쉼터 교체사업**

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 8.
- 사업대상 : 농성동 63-2번지
- 사업내용 : 노후 주민쉼터 교체
- 소요예산 : 50,000천원(특교금 50,000)

[상반기 추진실적]

- 추경예산 편성 : '25. 5.
- 현장조사 및 실시설계 : '25. 5.

[하반기 계획]

- 쉼터 철거 및 신규 조성 : '25. 6. ~ 8.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	산림휴양팀장 송희주(360-7897)	주무관 안효희(360-7899)
----------------------	----------------------	-------------------

맨발 이용자들의 눈높이에 맞춘 시설개선 및 주민들과 함께하는 맨발
유지관리로 주인의식을 함양하고 체계적인 맨발관리로 건강 100세 삶에 기여

□ 역점 맨발로[路] 조성 및 관리

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 18개동 맨발로
- 사업내용 : 맨발로 시설개선, 착한 캠페인 추진 등
 - 주민과 함께하는 맨발로 관리
 - 주민과 함께하는 맨발로 착한 캠페인 추진
- 소요예산 : 191,851천원(구 191,851)

[상반기 추진실적]

- 맨발로 조성·관리계획 수립 : '25. 2. 13.
 - 맨발로 유지관리원 선발·운영(2명), 노인일자리 배치(60명)
- 맨발로 신규조성
 - 동천동 유적근린공원(180m) : '24. 12. ~ '25. 4.
 - 풍암동 금당산 정상구간(4,600m) : '24. 11. ~ '25. 4.
- 맨발로 시설개선
 - 세죽장 비가림시설 설치(7개소) : '24. 11. ~ '25. 4.
 - 동천동 완충녹지 안심조명 설치 : '25. 2. ~ 4.
 - 상무시민공원 복합형 세죽장 설치 : '25. 4. ~ 5.
 - 백마산 생태습지 관정개발 및 세죽장 설치 : '25. 4. ~ 5.
- 동호회 연계 자발적 관리인 지정 운영 : '25. 3. ~ 12.
- 주민과 함께하는 맨발로 착한 캠페인 추진: 연중
 - 맨발로 주변 토사함 설치(23개소) 및 물품 지급

[하반기 계획]

- 맨발로 시설개선
 - 금당산 맨발로(1구간) 경관조명 설치 : '25. 6. ~ 9.
 - 화정근린공원 맨발로 재정비 : '25. 6. ~ 9.
- 맨발로 유지관리 : 연중



【세족장 비가림막 설치】



【복합형 세족장 설치】

공원녹지과장 이정경(360-7402) | 산림휴양팀장 송희주(360-7897) | 주무관 안효희(360-7899)

□ **신규 동천동 맨발로 안심조명 설치**

[추진개요]



- 사업기간 : 2025. 1. ~ 5.
- 사업대상 : 동천동 완충녹지(서구 동천동 505 일원)
- 사업내용 : 완충녹지 300m 경관조명 설치
- 소요예산 : 60,000천원(구 60,000, 주민참여예산)

[상반기 추진실적]

- 추진계획 수립 : '25. 2.
- 현장조사 및 실시설계 : '25. 3. ~ 4.
- 사업 추진 : '25. 4. ~ 5.

[하반기 계획]

- 유지관리 : 연중

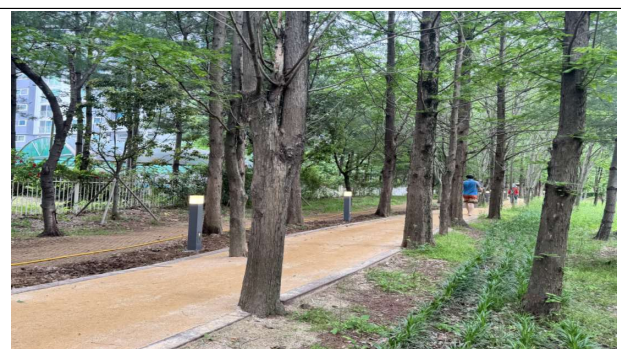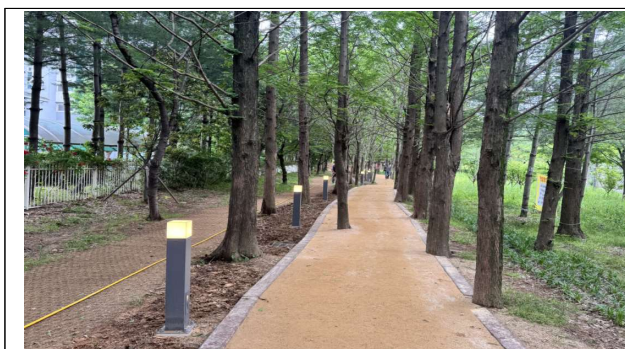

【안심조명 설치】

공원녹지과장 이정경(360-7402) | 산림휴양팀장 송희주(360-7897) | 주무관 안효희(360-7899)

□ **신규** 화정근린공원 시설개선 사업

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 10.
- 사업대상 : 화정동 325(화정근린공원)
- 사업내용 : 맨발로 등 시설정비
- 소요예산 : 100,000천원(특교금 100,000)

[상반기 추진실적]

- 추경예산 편성 : '25. 5.
- 현장조사 및 실시설계 : '25. 6. ~ 8.

[하반기 계획]

- 시설정비 사업 추진 : '25. 8. ~ 10.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	산림휴양팀장 송희주(360-7897)	주무관 안효희(360-7899)
----------------------	----------------------	-------------------

□ **신규** 금당산 산책로 경관조명 설치사업

[추진개요]

- 사업기간 : 2025. 5. ~ 9.
- 사업대상 : 풍암동 1044번지 일원(금당산 산책로)
- 사업내용 : 금당산 힐링숲길(1구간) 700m 경관조명 설치
- 소요예산 : 200,000천원(특교세 200,000)

[상반기 추진실적]

- 추경예산 편성 : '25. 5.
- 현장조사 및 실시설계 : '25. 6. ~ 7.

[하반기 계획]

- 경관조명 설치사업 추진 : '25. 8. ~ 9.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	산림휴양팀장 송희주(360-7897)	주무관 안효희(360-7899)
----------------------	----------------------	-------------------

장기미집행 도시공원 조성사업에 대해 우리구 차원에서 주민들의 요구·숙원사항들이 공원 계획에 반영될 수 있도록 체계적인 대응으로 도심속 녹지공간 보전 및 주민 삶의 질 향상

□ 일반 민간공원 특례사업

[추진개요]

- 위 치 : 중앙근린공원, 마륵근린공원
- 사업주체 : 광주광역시, 빚고을중앙공원개발(주), 중앙파크(주), 마륵파크(주)
- 규모 : 총 3,261,793㎡(중앙근린 3,032,190㎡, 마륵근린 229,603㎡)
- 사업내용
 - 중앙근린 1지구 2,435,516㎡(공원 91.97%, 비공원 8.03%) / 롯데(2,772세대)
 - 중앙근린 2지구 596,674㎡(공원 93.23%, 비공원 7.77%) / 호반 (695세대)
 - 마륵근린 229,603㎡(공원 77%, 비공원 23%) / 호반 (999세대)
- 사업기간
 - 중앙근린 1지구 : '20. 6. 1. ~ '27. 12. 31.
 - 중앙근린 2지구 : '20. 6. 1. ~ '26. 12. 31.
 - 마륵근린 : '20. 6. 15. ~ '25. 12. 31.

[상반기 추진실적]

- 중앙근린공원 1지구
 - 공원시설 실시계획인가(변경)을 위한 관계기관 협의(시) : '25. 3. ~
 - 풍암호수 일원 공사 추진에 따른 폐쇄 안내 현수막 게첨(시행사) : '25. 6. 26.
 - 마을숲4 조성관련 주민간담회 추진 : '25. 6. 26.
 - 화장실 위치 조정, 농구장 설치에 따른 소음, 체육시설 부설주차장 요청
- 마륵근린공원
 - 금호1동 주민자치회 공원 현장점검 : '25. 1. 23.
 - 서구의회 임시회(사회도시위원회) 현장방문 : '25. 2. 12.
 - 금호1동 주민자치회 의견수렴(2회) : '25. 5. 13 / 6. 11
 - 마륵근린공원 조성 관련 주민설명회 개최 : '25. 6. 23.
- 주민 건의사항 등 반영 요청
 - (마륵근린) 주민 및 서구의회 임시회 현장방문 건의사항 반영 요청 : '25. 2. 26.
 - 물놀이장, 특색있는 놀이터, 피크닉장 등 주민의견 반영한 공원 조성 요청

[하반기 계획]

○ 중앙근린공원 1지구

- 공원시설 실시계획인가 변경인가 고시 : '25. 7.
- 풍암호수 일원 등 공원공사 착공 (예정) : '25. 7. 21 ~

○ 마륵근린공원

- 공원 내 각종시설 현장 합동점검 실시(주민포함) : '25. 8. ~ 9.
- 공원 준공 및 인수인계 추진 : '25. 10. ~

공원녹지과장 이정경(360-7987)	공원조성팀장 이정연(360-7990)	주무관 이호진(360-7587)
----------------------	----------------------	-------------------

□ 일반 재정공원 조성

[추진개요]

- 추진배경 : 장기미집행 도시계획시설 일몰에 대비하여 광주시 재정을 투입하여 추진중인 재정공원에 주민숙원사업 반영 등 선제적 대응
- 사업기간 : 2020년 ~ 2027년
- 사업대상 : 근린공원 3개소(운천, 발산, 영산강대상)
 - 운 천 : 21,504㎡(힐링숲, 어린이놀이터, 운동시설, 피크닉장 등)
 - 발 산 : 107,047㎡(생성숲 조성 및 산책로 등)
 - 영산강대상 : 620,198.1㎡[서구 29%, 180,488㎡](산책로 조성 등)
- 소요예산 : 2,933억원(토지매입비 2,829 / 공원조성 104)

[상반기 추진실적]

- 발산근린공원
 - 추경 예산 확보(광주시 추진) : '25. 1. ~
- 영산강대상근린공원
 - 토지보상 추진 : '25. 1. ~
- 운천근린공원
 - 시설물 철거 및 수목 제거사업 : '25. 1. ~ 6.

[하반기 계획]

○ 발산근린공원

- 공원조성계획 및 실시계획용역(광주시 추진) : '25. 7. ~ '26. 7.

공원녹지과장 이정경(360-7402)	공원조성팀장 이정연(360-7990)	주무관 장주연(360-7058)
----------------------	----------------------	-------------------
